

4일차 3교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

평가 기준 수립

효과·비용·기간·위험·수용성

기준을 먼저 합의하고 점수는 나중에

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 다섯 기준이 이번 사례에서 무엇을 재는지 설명한다
- ② 기준마다 1~5점 앵커 문장을 갖춘 채점 기준표를 만든다
- ③ 낮을수록 좋은 기준을 뒤집고 근거 있게 가중치를 정한다

결과물: 채점 기준표 + 가중치 — 4교시 가중 평가의 잣대

다섯 기준과 기본 가중치

기준	가중치	묻는 질문	좋은 쪽
효과	30%	원인을 얼마나 직접 없애나	높을수록
비용	20%	돈·인력이 얼마나 드나	낮을수록
실행기간	20%	효과까지 얼마나 걸리나	짧을수록
위험도	15%	실패·부작용 가능성과 피해	낮을수록
현장수용성	15%	현장이 받아들이고 지키나	높을수록

07_improvement_workbook.xlsx · 3_대안평가매트릭스 머리글 그대로 — 합 100%

점수는 언제나 「높을수록 좋다」로 통일

방향을 섞으면

비싼 대안에 비용 5점 → 가중합계에서 위로 올라간다

- 비용 큼 = 5점 (틀림)
- 위험 큼 = 5점 (틀림)
- 결론이 거꾸로 나온다

VS

방향을 뒤집으면

모든 기준에서 5점 = 바람직한 쪽

- 비용: 5 = 저비용
- 실행기간: 5 = 짧음
- 위험도: 5 = 안전

기준의 뜻을 우리 사례로 좁히기

1

효과

SF-02 를 PM 전 수준(불량률 2.11%, OEE 82.8%)으로 되돌리는 기여

2

비용 · 실행기간

추가 구매·용역·인력 / 착수부터 효과 확인까지

3

위험도 · 현장수용성

시행 중 생산 차질·사고 가능성 / 작업 부담과 관행 충돌

효과의 근거

온도편차

6.0 → 16.6°C

앵커 문장 — 「이런 경우가 몇 점」

기준	5점	3점	1점
효과	주원인 직접 제거	부원인·재발 피해 감소	데이터로 확인 불가
비용	기존 인력·양식	부서 예산 안 구매	별도 투자 승인
실행기간	1주 안	3개월 안	6개월 이상
위험도	되돌리기 쉬움	일시 생산 차질	품질·안전 사고 가능
현장수용성	현장이 원하던 일	교육·습관 변화 필요	업무 크게 늘어 반발

2점·4점은 사이 값 · 실행기간은 2점 = 6개월 안, 4점 = 1개월 안

채점 기준표 초안 프롬프트의 핵심 장치

- 1 역할과 상황**
대안 평가를 운영해 본 품질경영 전문가 · 교정 누락 문제
- 2 방향 고정**
모든 기준에서 5점 = 바람직 — 이 문장을 빼면 AI 도 섞는다
- 3 관찰 가능한 표현**
세 명이 같은 점수를 줄 만큼 구체적으로
- 4 금액 대신 결재 수준**
기존 인력으로 가능 · 부서 예산 안 · 별도 승인


가중치를 정할 때의 세 원칙

- 1 대안을 보기 전에 정한다**
보고 나서 정하면 마음에 드는 대안에 맞추게 된다
- 2 한 기준 50% 이상은 피한다**
그 기준 하나로 정하는 셈 — 차라리 먼저 거른다
- 3 같은 것을 두 번 재지 않는다**
비용과 투입 인력을 따로 두면 이중 계산

기본값 30/20/20/15/15 에서 바꿨다면 이유 한 줄 — 그대로 보고서 문장이 된다

자주 틀리는 지점

비용 칸에 「비쌀수록 5점」

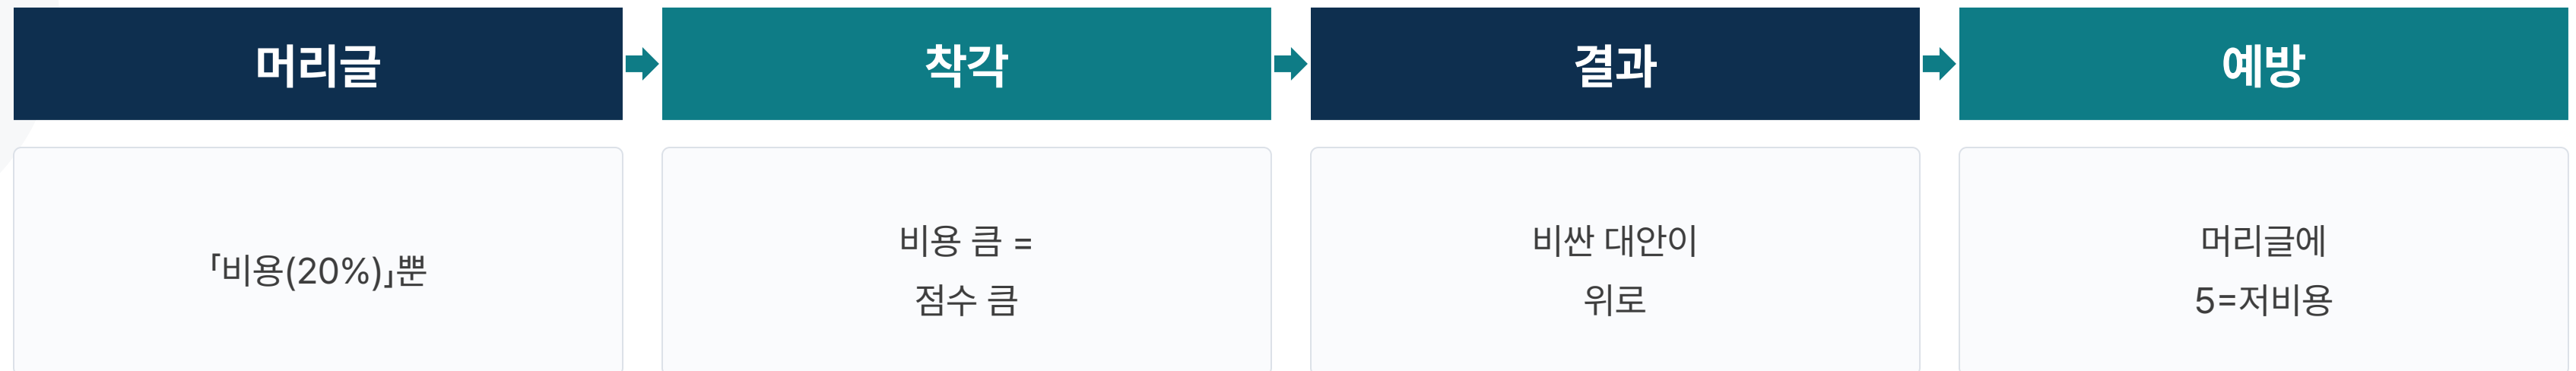

머리글을 「비용(20%, 5=저비용)」으로 바꿔 두면 회의 때마다 생기는 혼선이 사라진다

이 45분이 끝날 때 확인할 것

- 1 다섯 기준 모두 1·3·5점 앵커 문장이 있다
- 2 비용·실행기간·위험도는 5점 = 저비용·짧음·안전
- 3 가중치 합 100%, 바꿨다면 이유 한 줄
- 4 가중치를 점수 매기기 전에 확정했다

4일차 3교시 · 실습 마무리

다음은 대안별 우선순위화

기준표대로 점수를 매기고 가중합·RANK 로 순위를 낸 뒤, 효과 추정과 민감도로 검증합니다

✓ 각자 채점하고 합의

✓ 가중합계·RANK 로 순위

✓ SF-02 회복 효과를 Excel 로 계산

✓ 가중치를 흔들어 1위 확인

가져갈 것

채점 기준표와 확정된 가중치
